

VOL.

9

鳥栖・三養基西部溶融資源化センター

解体撤去工事だより

建設業
週休二日工事の詳細については、右のQRコードにて
ご覧ください。(組合HP)

発行日：令和7年11月

発行者：村本・篠原共同企業体

監修：鳥栖・三養基西部環境施設組合

最近急に寒くなりましたが、工事は順調です！



11月

平素より当工事にご理解いただきありがとうございます。10月は引き続き建物内装解体と粉じん対策としての外部足場の組立を行いました。中旬からは建物内のアスベスト含有資材の撤去作業も行っています。今後も周辺環境へ影響が生じないよう対策を徹底してまいりますので、引き続きご協力の程、宜しくお願ひ致します。

■工程表 (凡例 赤線：実施 黒線：予定)

工事工種	R6	令和7年												令和8年											
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
準備工事	準備工事																								
足場設置工事																									
汚染物除去工事																									
アスベスト除去工事																									
解体工事																									
場内整備工事																									
環境調査																									

工事の進捗率 32.8%


10月末時点

10月の作業の状況写真です

▼西面外部足場全景（シート設置）



■工事の進捗状況 (撮影日10月23日現在)

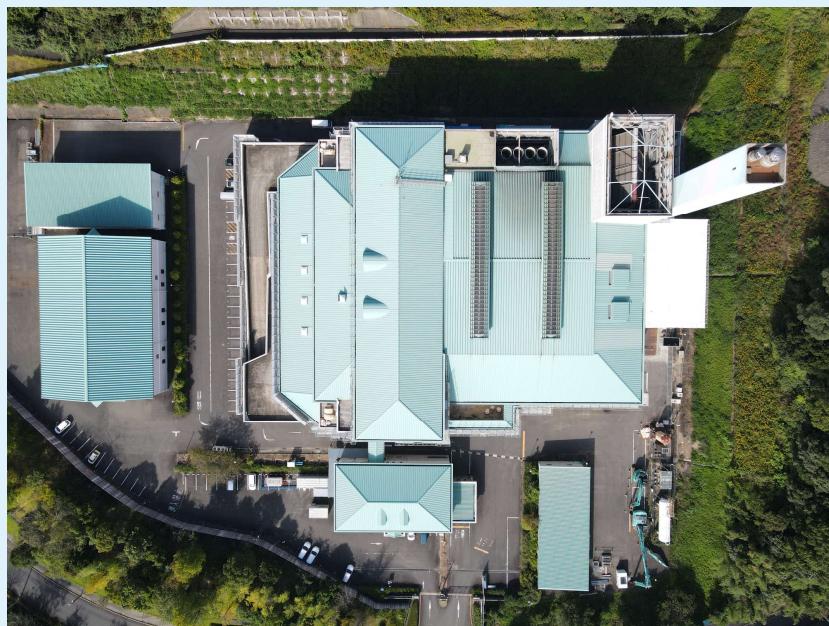

▼南面外部足場全景



▼前室全景



■11月の工事予定

建物内装および内部焼却設備の解体撤去を進めると共に、アスベストを含んだ外壁塗装の下地塗材の除去作業を進めていく予定です。
