

解体撤去工事だより



工事の詳細については、右のQRコードにて
ご覧ください。(組合HP)



発行日：令和8年1月

発行者：村本・篠原共同企業体

監修：鳥栖・三養基西部環境施設組合



昨年にご協力ありがとうございました。

12月からは建物内装と溶融設備の解体、外部足場の組立及び、建物外壁のアスベスト含有材の撤去作業を継続して作業しています。工事期間も半分を越えて折り返し地点となりました。今後も安全・安心な工事を心掛けていきますので、本年もどうぞよろしくお願い致します。



■工程表 (凡例 赤線：実施 黒線：予定)

《工事工程》	R6	令和7年												令和8年												
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
準備工事	準備工事	■	■	■																						
足場設置工事																										
汚染物除去工事																										
アスベスト除去工事																										
解体工事																										
場内整備工事																										
環境調査																										

工事の進捗率 43.5%

12月末時点

12月の作業の状況写真です

▼通路部分のアスベスト材(防水シート)を撤去しています




▼大型テントの中から溶融設備を撤去しています



▼建物内装材の撤去が完了しました



■工事の進捗状況 (撮影日12月18日現在)

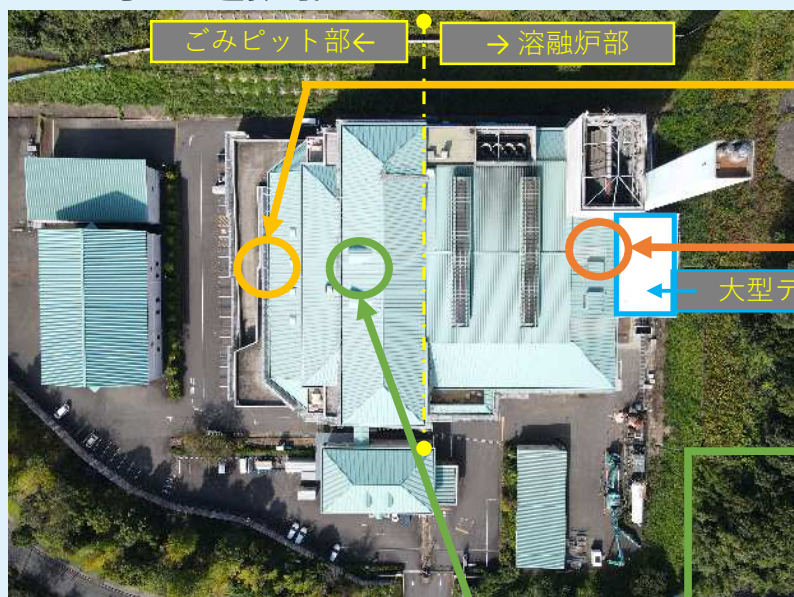

■1月の工事予定

煙突を除く建屋外壁部のアスベスト撤去は完了し、今後は左側のごみピット部の解体を進めるとともに、右側の大型テントの中から溶融炉部分の撤去も並行して進めていきます。
