



解体撤去工事だより

工事の詳細については、右のQRコードにて
ご覧ください。(組合HP)



発行日：令和8年2月

発行者：村本・篠原共同企業体

監修：鳥栖・三養基西部環境施設組合

本格的な解体作業に移行し、順調に進捗しています。



年明けから内部溶融設備の解体と一部残っていた内装設備の撤去を進めています。また、

外部ではごみピット部の建物解体を継続して作業しています。粉塵などの飛散を抑制するため養生シート囲いや散水を行いながら、解体・破碎作業を進めています。

引き続き、安全に工事を進めていきますので、ご協力のほど、よろしくお願い致します。

■工程表 (凡例 赤線：実施 黒線：予定)

《工事工種》	R6	令和7年												令和8年														
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
準備工事	準備工事																											
足場設置工事				足場設置工事																								
汚染物除去工事				汚染物除去・密閉等工事																								
アスベスト除去工事				アスベスト除去工事																								
解体工事				解体工事																								
場内整備工事																									場内整備			
環境調査				環境調査																								

工事の進捗率 44.9%


R8.1月末時点

1月の作業の状況写真です


▼通路の鉄骨・コンクリートを撤去しています




▼溶融設備の撤去を進めています

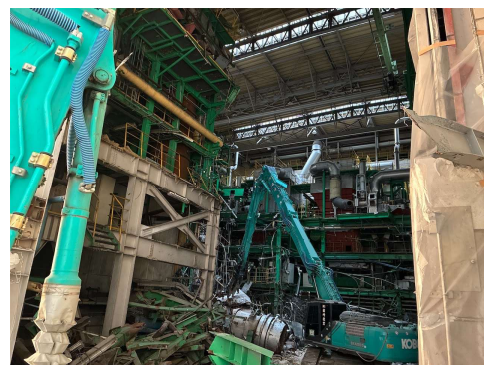

▼内装材の搬出が完了しました

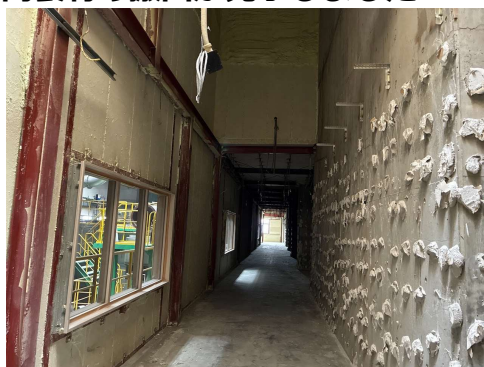

■工事の進捗状況 (撮影日1月20日現在)

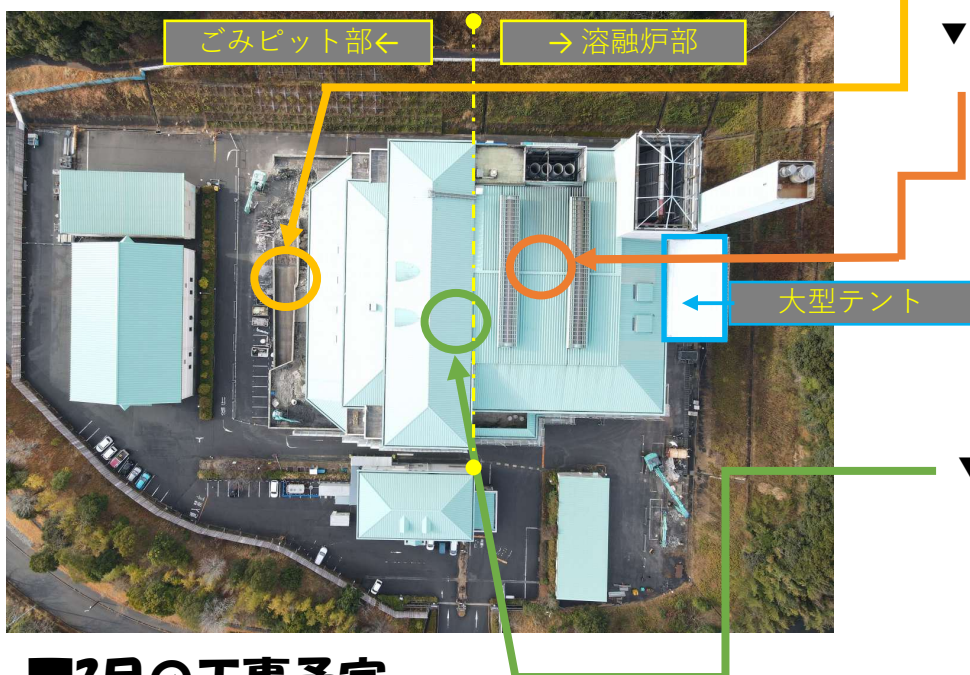

■2月の工事予定

ごみピット部の解体を進めながら、大型テントの中から溶融炉部分の解体撤去を並行して進めます。また、煙突の北側にある外部設備解体の作業準備に取り掛かります。
