



## 解体撤去工事だより

工事の詳細については、右のQRコードにて  
ご覧ください。(組合HP)



発行日：令和8年6月

発行者：村本・篠原共同企業体

監修：鳥栖・三養基西部環境施設組合

## 建物の解体は順調に進捗しています。



溶融炉設備や建物の地上部の解体は完了し、地上では煙突のみが残る状況になりました。

現在は解体後のコンクリート殻、鉄くず、ガラスワルや雑材を分別集積し搬出作業を行っています。

又、解体中の環境調査の結果（ダイリンシ類、アスベスト）も基準値を満足し良好です。

引き続き安全に工事を進めて参りますので、ご協力のほどよろしくお願い致します。



## ■工程表 (凡例 赤線：実施 黒線：予定)

R6 《工事工種》	令和7年												令和8年											
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
準備工事	準備工事																							
足場設置工事																								
汚染物除去工事																								
アスベスト除去工事																								
解体工事																								
場内整備工事																								
環境調査																								

工事の進捗率 61.4%


R8.5月末時点

5月の作業の状況写真です

▼重量物は機械で分別しています。



## ■工事の進捗状況 (撮影日5月19日現在)

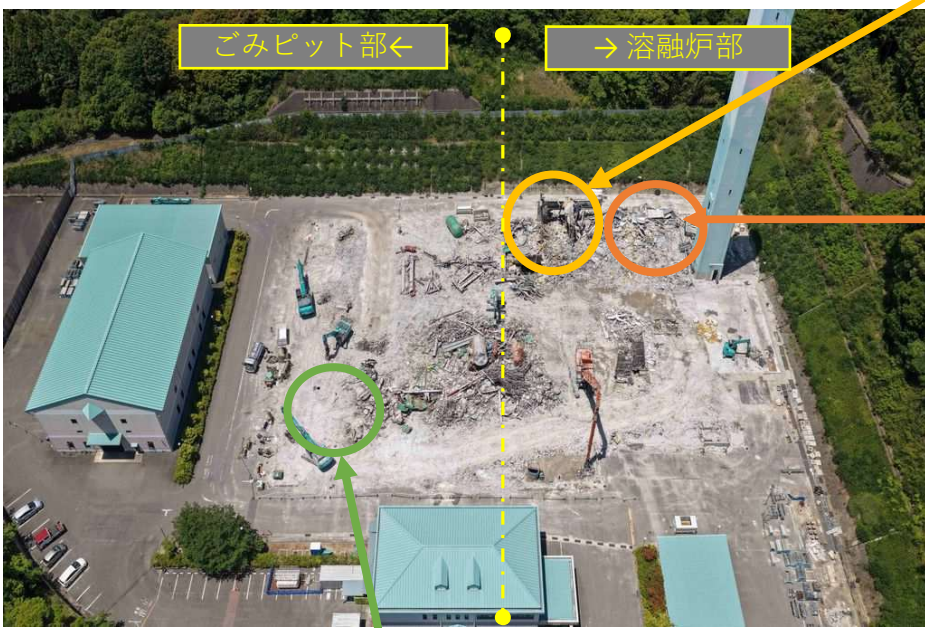

▼細かいものは人力で分別しています。



▼建物の地上部は解体完了しました。



## ■6月の工事予定

解体後の分別を引き続き実施し適宜搬出します。同時に煙突解体のための足場の組み立てや地下構造物撤去に向けて掘削の準備など進めていく予定です。
