



解体撤去工事だより

発行日：令和8年8月

発行者：村本・篠原共同企業体

監修：鳥栖・三養基西部環境施設組合

工事の詳細については、右のQRコードにてご覧ください。(組合HP)



暑い日が続いてますが、工事は順調に進んでいます。

当月は地上部解体後の混在していた解体材の分別搬出が終わり、同時進行していた



地下構造物の解体および撤去搬出を継続して進めています。煙突については外壁塗装

下地のアスベスト除去作業は7月中旬に完了し、その後煙突解体作業に進む計画です。

引き続き安全に工事を進めて参りますので、ご協力のほどよろしくお願い致します。



■工程表(凡例) 赤線：実施 黒線：予定)


《工事工種》	R6	令和7年												令和8年																				
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
準備工事	準備工事																																	
足場設置工事				足場設置工事																														
汚染物除去工事				汚染物除去・密閉等工事																														
アスベスト除去工事				アスベスト除去工事																														
解体工事				解体工事																														
場内整備工事																										場内整備								
環境調査				環境調査																														

工事の進捗率 72.4%


R8.7月末時点

7月の作業の状況写真です

▼円形の大小2つの設備が煙突の内筒です。

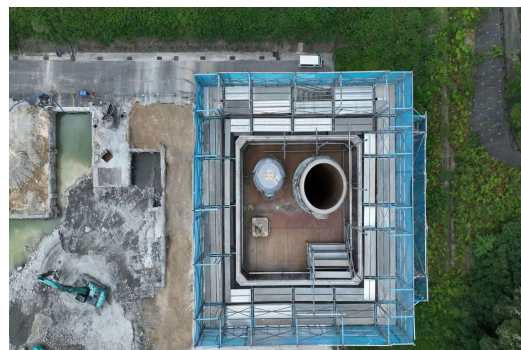

■工事の進捗状況 (撮影日7月13日現在)

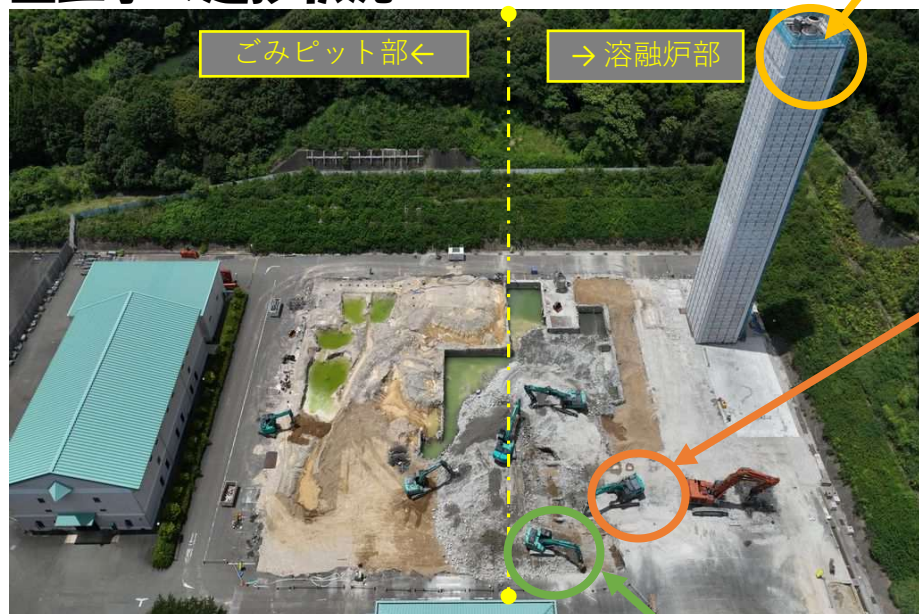

▼粉塵の飛散防止として、散水作業は継続中です。



▼解体したコンクリートがらは外部に搬出処理しています。



■8月の工事予定

引き続き解体材を適宜搬出しつつ、地下構造物の解体作業と解体材の搬出を継続していきます。地下構造物撤去後の土による埋め戻しもあわせて実施します。煙突は内側設備を撤去した後、外側のコンクリート構造物を上から順に輪切り切断し撤去します。
