

事業報告

令和8年8月26日

鳥栖・三養基西部環境施設組合

事業報告

●溶融資源化センター解体撤去工事関連について

工事名：溶融資源化センター撤去工事

工 期：令和6年12月2日から令和8年12月28日まで

受注者：村本・篠原共同企業体

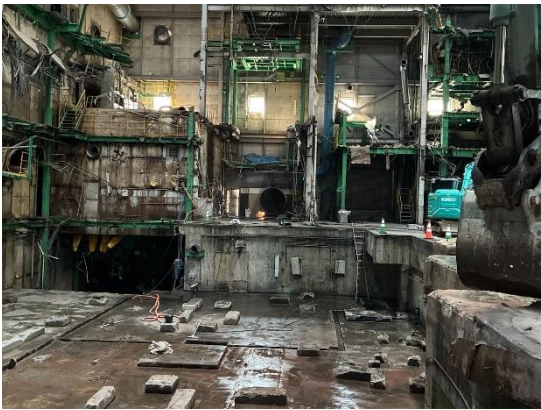
契約額：1,580,700,000 円

年度ごとの工事内容

令和6年度	工事計画書の策定、工事準備、スロープ部分の解体
令和7年度	ダイオキシン類除染、アスベスト撤去、プラント機器の撤去
令和8年度	建屋、煙突解体、基礎部分撤去、整地

令和8年2月から令和8年7月までの工事状況について

期 日	項 目	内 容
2月26日	工程会議	月間工程、施工計画（煙突除染工） 工事進捗率 47.7%（計画 47.7%）
3月4日	脱硝設備の密閉養生及び 集塵機設置状況確認	
3月13日	脱硝設備内部の除染状況確認	

期 日	項 目	内 容
3月16日	煙突内部の除染状況確認	
3月18日	内部設備解体撤去状況の確認及び撤去後の空間ダイオキシン類調査	
3月23日	令和7年度完了検査	
3月25日	周辺環境（ダイオキシン類、アスベスト）調査立会	
3月26日	工程会議	月間工程、施工計画（基礎解体工） 工事進捗率 49.9%（計画 49.9%）

期 日	項 目	内 容
4 月 8 日	香田地区現地見学 プラント内部の撤去状況確認	
4 月 1 5 日	環境調査現場立会	脱硝設備解体に係るダイオキシン類
4 月 1 7 日	周辺環境調査立会	大気中ダイオキシン類、ため池採水
5 月 2 8 日	工程会議	月間工程、地下部分の埋め戻し土 工事進捗率 61.4%（計画 61.4%）
6 月～7 月	残置する杭の位置確認	
6 月 2 2 日	工程会議	月間工程、産業廃棄物処理計画追加分 材料承認願（埋戻し土） 工事進捗率 64.7%（計画 65.7%）  煙突解体足場設置状況
7 月 2 3 日	工程会議	月間工程、 工事進捗率 72.4%（計画 74.1%）

【解体工事状況】

①状況写真（R8.2月時点）



②状況写真（R8.7月末時点）



③ダイオキシン類の除染作業



④アスベストの除去作業



⑤（ばいじん）廃棄物処理の追跡調査



⑥（アスベスト）廃棄物処理の追跡調査



⑦内装解体状況



⑧内部設備解体状況



⑨内部設備解体状況



⑩建屋解体状況



⑪金属類搬出状況



⑫令和7年度完了検査（書類）



●環境調査について

環境調査においては、1月と7月にモニタリング井戸水質検査及び一般家庭井戸水検査を行いました。

この調査については、ごみ処理事業終了後3ヵ年（令和6年度～令和8年度）の事後モニタリングとして、溶融資源化センター周辺で実施しています。

調査箇所は、下流調整池、モニタリング井戸（2か所）、吉原ため池、一般家庭井戸水（6か所/年）となっています。例年、1月と7月に一般家庭井戸及びモニタリング井戸、10月に下流調整池及び吉原ため池を調査しています。

現在まで溶融資源化センター解体撤去工事に伴う水質汚染等はありません。

実施内容	測定結果
令和8年1月19日 ・一般家庭井戸水（3件） 令和8年1月19日 ・東側、西側モニタリング井戸	・一般家庭井戸水 水質基準に適合 ・モニタリング井戸 水質基準に適合
令和8年7月27日 ・一般家庭井戸水（3件） ・東側、西側モニタリング井戸	水質分析中

