

VOL.

7



鳥栖・三養基西部溶融資源化センター

解体撤去工事だより

発行日：令和7年9月

発行者：村本・篠原共同企業体

監修：鳥栖・三養基西部環境施設組合

例年になく猛暑が続きますが、工事は順調です！



内部焼却設備の汚染物（ダイオキシン類）の除去作業が無事完了しました。

処理棟内に大型機械を入れるための入口（前室）の設置作業も順調に進んでいます。

また、事務所や廊下などの内装（壁・天井・床など）の解体撤去作業も同時に進めています。

■工程表 (凡例 赤線：実施 黒線：予定)

《工事工種》	R6	令和7年												令和8年														
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
準備工事	準備工事																											
足場設置工事				足場設置工事																								
汚染物除去工事				汚染物除去・密閉等工事																								
アスベスト除去工事				アスベスト除去工事																								
解体工事				解体工事																								
場内整備工事																									場内整備			
環境調査				環境調査																								

■工事の進捗状況 (撮影日 8月25日現在)



■9月の工事予定


処理棟内に大型重機を投入し焼却設備を解体します。内装解体作業も同時に実施します。また、処理棟外部には建屋解体時の粉塵飛散防止対策として外部足場を設置していきます。

工事の進捗率 18.8%

8月末時点

8月の作業の状況写真です

▼内装解体工（壁・天井・床など）

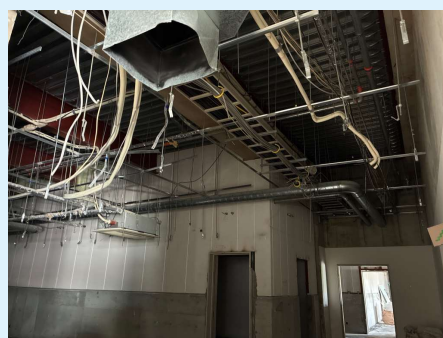

▼解体材は金属や木材などに分別してコンテナに集積し、産廃処理します



▼前室の壁になる足場を組み立てています

