VOL. 4

建設業 週休二日

鳥栖・三養基西部溶融資源化センター

解体撤去工事だより

発行日：令和7年6月
発行者：村本・篠原共同企業体
監修：鳥栖・三養基西部環境施設組合

工事は順調に進行しています！

6月

密閉養生作業が終わり**施設内部の汚染物（ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類）の除去作業**に移りました。
大型集じん機で建物内の空気を吸い出して気圧を下げ、建物外に汚染物等が流出しないように管理しています。吸い出す空気は高性能フィルターでろ過して、きれいな空気にして排出しています。
引き続き安全対策を徹底して進めてまいりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

■工程表　(凡例　赤線：実施　黒線：予定)

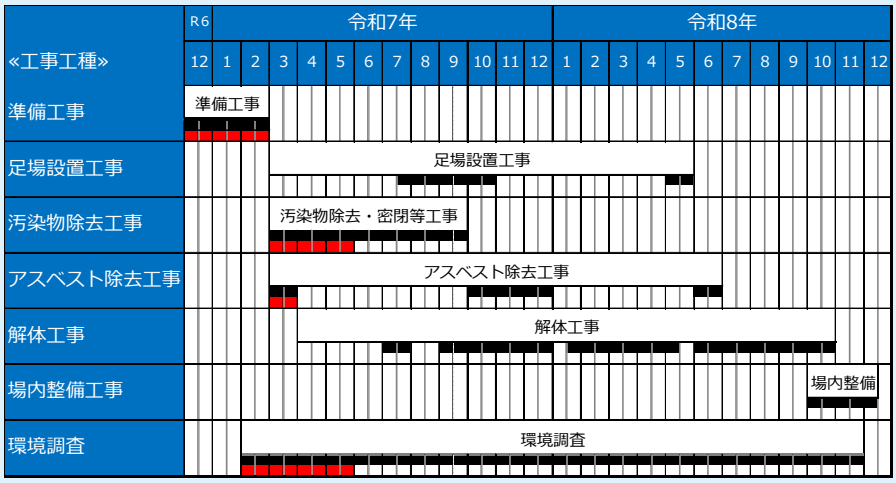

工事の進捗率　8.0%
5月末時点

5月の作業の状況写真です

▼大型集じん機を設置しました。

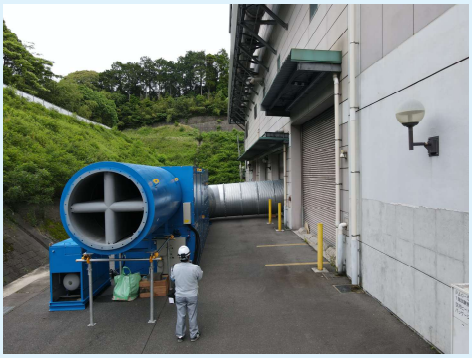

▼建物内外の気圧差を常時監視しています。

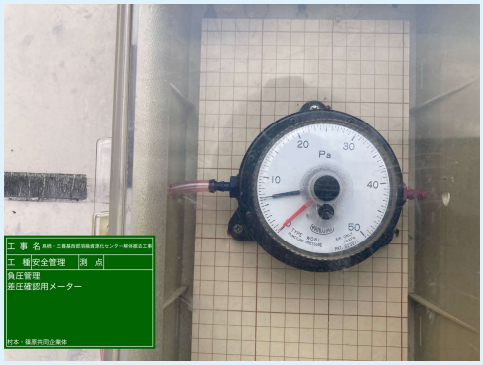

▼ﾌﾞﾛｯｸ積とｼｰﾄで洗浄水も外部に出しません。

■工事の進捗状況　(撮影日　5月15日現在)

■6月の工事予定

汚染物を除去する作業を継続します。固まった汚染物を削ぎ落し高圧水洗浄します。水は場内で集水ろ過して再利用します。
